

CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE

nr. 54 din 21.05.2025

Între:

Container Plus Storage SRL cu sediul în Galați, str. Smardan nr. 1, înregistrat la Registrul Comerțului sub numărul J2021000111170, cod unic RO43594055, cont IBAN RO75BTRLRONCRT0586402301 deschis la Banca Transilvania sucursala Galați, reprezentată de Gavrilă Adrian în calitate de administrator, care va fi numit în continuare **VANZATOR**.

Și,

COMUNA BOGDANESTI, avand adresa: Str. Stefan cel Mare Nr. 186, loc. Bogdanesti, Jud. Vaslui, avand cod unic de inregistrare **4446686**, IBAN TREZORERIE RO08TREZ65724510220XXXXX, RO45TREZ6575006XXX003328,

în calitate de **BENEFICIAR**, care va fi numit în continuare **BENEFICIAR**.

S-a încheiat astăzi, 21.05.2025 prezentul contract în 2 (două) exemplare, ambele cu putere de original.

I. OBIECTUL ȘI VALOAREA CONTRACTULUI

Art.1. - Prezentul contract are ca obiect: Vanzarea de container monobloc cu specificatiile si dotarile din anexa 1, anexa 2, anexa 3 a acestui contract.

Art.2 - Valoarea totală a contractului este de **196490 Lei, TVA inclus**

Transportul, descarcarea si montajul: Incluse in pret.

II. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la 21.05.2025 până la data de 20.05.2026.

III. CONDIȚII DE PLATĂ

Art. 4 - **BENEFICIARUL** va achita 50% pana la data de 10.07.2025, restul urmand a fi achitat la livrare.

Art. 5 - Valoarea facturii se va stabili prin anexa 1, care face parte integrantă din contract.

IV. OBLIGAȚIILE PARȚILOR

A) VANZATORUL

- Sa anunte CUMPARATORUL cu cel putin 3 zile inainte de sosirea marfii,
- Sa livreze marfa in 50 - 55 zile lucratoare de la primirea avansului,
- Produsul livrat sa respecte toate specificatiile si dotarile din anexa 1 care fac parte din acest contract,
- Oferă termen de garanție de 12 luni.

PRESTATOR
SC Container Plus Storage SRL




BENEFICIAR
COMUNA BOGDANESTI



Secretar: Stanga Gheorghita Laurentiu

Contabil: Blanaru Gabriel



Tel: 0748 334 334 office@containerplus.ro

B) BENEFICIARUL

- Sa achite VANZATORULUI contravaloarea marfii in conditii prevazute la art. 4,
- Sa asigure teren si posibilitate de acces cu camion pentru a putea fi amplasat containerul.

V. CLAUZE DE FORȚĂ MAJORĂ

Art. 6. - Nici una din părțile contractante nu răspund pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător total sau parțial, dacă neexecutarea a fost cauzată de un eveniment imprevizibil cum ar fi: război, cutremur, calamități, inundații, mișcări sociale, stare de urgență, interdicții legale, defecțiuni de ordin tehnic ce au ca drept urmare întârzierea lucrării, notificată în termen de 72 de ore de la data apariției și atestată cu documente corespunzătoare în termen, partea aflată în culpă fiind în asemenea cazuri exonerată de răspundere.

Art. 7. După încetarea situației de forță majoră, părțile vor hotărî de comun acord asupra continuării sau nu a obligațiilor contractului.

VI. ARBITRAJ

Art. 8. - Litigiile nerezolvate pe cale amiabilă, vor fi înaintate spre soluționare instanței judecătorești competente din județul în care beneficiarul își are sediul social.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 9. - Prezentul contract încetează de plin drept, cu condiția restituirii avansului încasat de către vânzător fără a fi necesară intervenția unei instanțe judecătorești, în cazul în care oricare dintre părți:

- nu execută obligațiile considerate esențiale pentru acest contract;
- este declarată în stare de incapacitate de plată;
- cesionează drepturile și obligațiile sale fără acordul celeilalte părți;
- dacă părțile agreează în scris încetarea contractului.

VIII. DIVIZAREA CONTRACTULUI

Art. 10. - În cazul în care, de comun acord, una sau mai multe clauze din prezentul contract au devenit nule ori s-au modificat, celelalte clauze vor continua să-și producă efectele. Această situație va fi consemnată într-un act adițional semnat de ambele părți.

IX CLAUZE DE CONFIDENȚIALITATE

Art. 11. - Părțile au obligația de a păstra confidențialitatea operațiunilor comerciale intermediare, potrivit prezentului contract.

X. DISPOZIȚII FINALE

Art. 12. - Prezentul contract constituie singurul instrument juridic aprobat pentru soluționarea eventualelor litigii între părți. Legea care guvernează prezentul contract este legislația română în vigoare.

Art. 13. La acest contract se pot adăuga, în timpul derulării lui, acte adiționale referitoare la programul în sine și modificări ulterioare de comun acord, semnate de ambele părți.

PRESTATOR
SC Container Plus Storage SRL




BENEFICIAR
COMUNA BOGDANESTI



Secretar: Stanga Gheorghita Laurentiu

Contabil: Blanaru Gabriel



Tel: 0748 334 334 office@containerplus.ro

Client: **COMUNA BOGDANESTI**

Tel: **0726 529 120**

e-Mail: **vasluianuedina@yahoo.com**

Adresa descarcare: **Loc. BOGDANESTI, Jud. VASLUI**

Container cu dimensiunile exterioare de: **8 m x 3 m x 2.86 m**

Structura sudata din profile zincate, de **2.5 mm**, si vopsite gri antracit RAL 7016
Pereti din panouri sandwich PUR cu grosimea de **40 mm**, culoare **alb RAL 9002**

Structura acoperis: de la exterior la interior:

- tabla zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- traverse din lemn si metal;
- folie anticondens;
- **panou sandwich 40 mm**;

Structura podea - de la exterior la interior:

- tabla cutata zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- **traverse din metal**;
- placa TEGO 18 mm;
- covor linoleum de trafic intens;

Instalatie electrica: panou electric cu sigurante automate de 6A si 16A, 5 buc. corp iluminat interior, intrerupatoare, priza exterioara de 16A.

TAMPLARIE: ALB (rama 40 mm)

★ Usa de intrare din tamplarie PVC, 800 x 2175 mm, integral panel deschidere dreapta, exterior;

★★★★★ Usa din tamplarie PVC, 700 x 2050 mm, integral panel, deschidere dreapta interior;

★ Fereastra din tamplarie PVC cu geam termopan, 500 x 600 mm, sistem de rabatare, plasa anti-insecte, deschidere dreapta.

Containerul include:

- 8 buc. wc;
- 3 buc. lavoar;
- 3 buc. oglinda;
- 3 buc. etajera;
- 11 buc. corp iluminat cu LED;
- 1 buc. convector 1000 W;
- 1 buc. boiler 20 litri.

Daca la locul descarcarii camionul cu macara nu poate intra sau nu poate descarca in locul indicat, eventuale costuri cu alte utilaje vor fi suportate de catre client.


Termen de executie: **12.08.2025**

BENEFICIAR
COMUNA BOGDANESTI

Secretar: **Stanga Gheorghita Laurentiu**

Contabil: **Blanaru Gabriel**



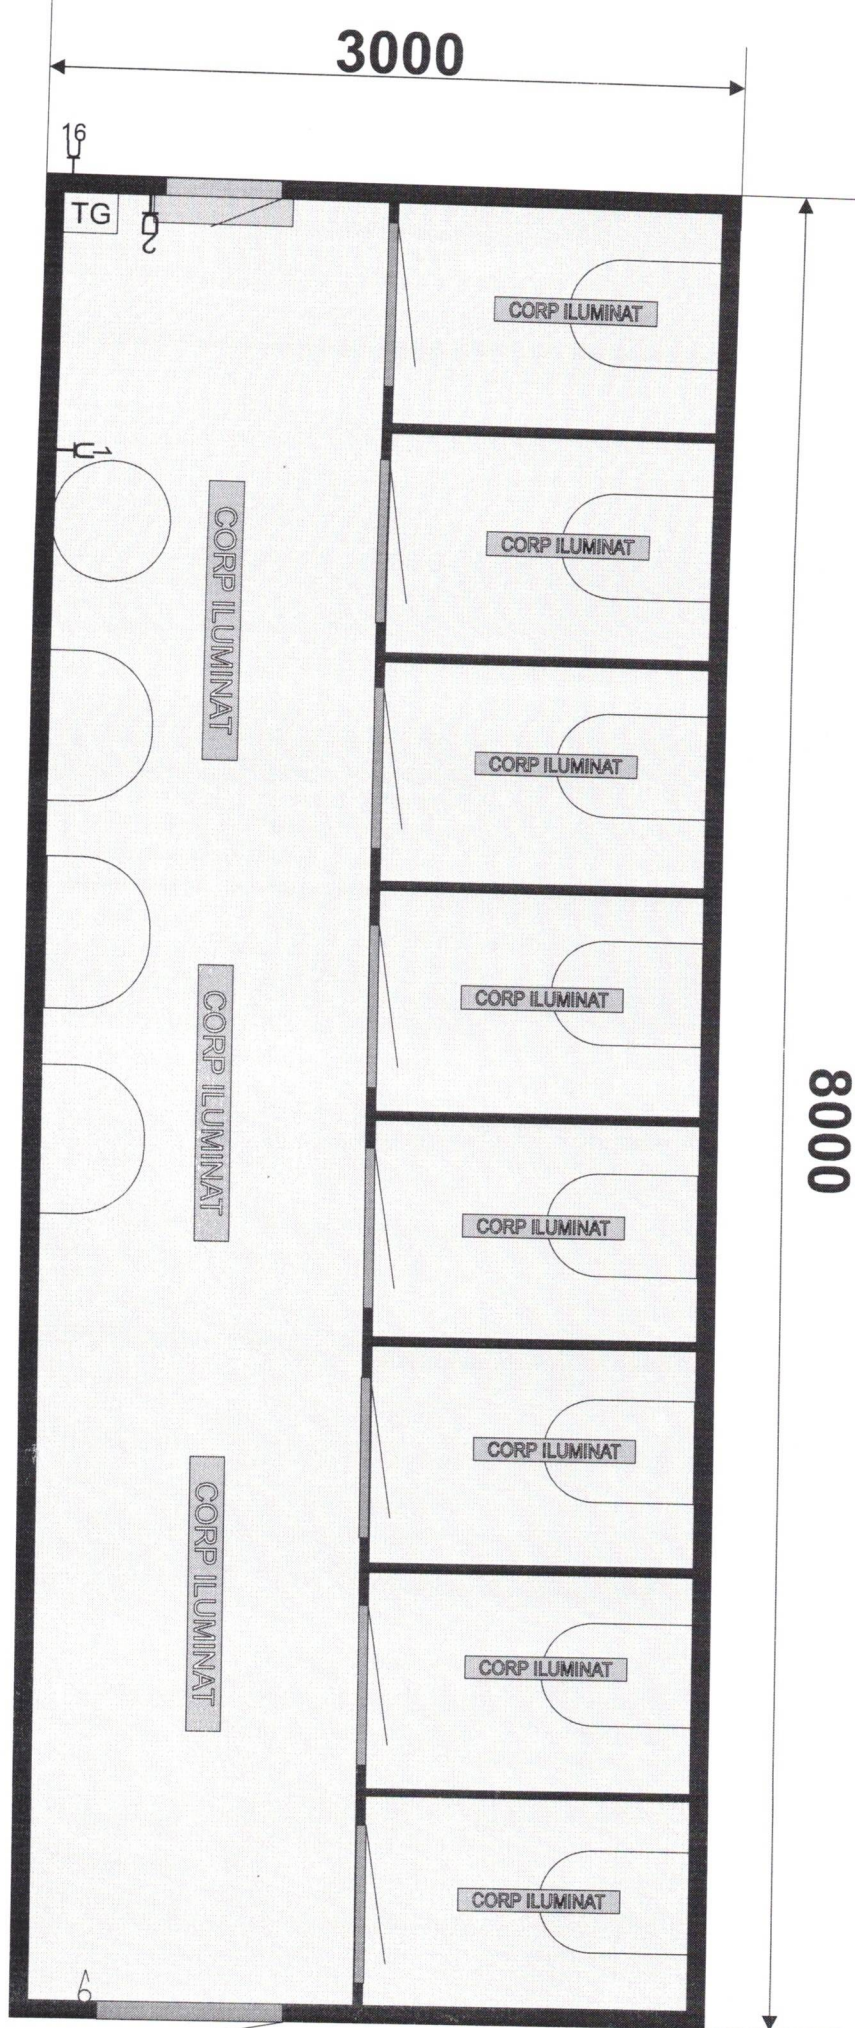

Client: **COMUNA BOGDANESTI**

Tel: **0726 529 120**

e-Mail: **vasluianuedina@yahoo.com**

Adresa descarcare: **Loc. BOGDANESTI, Jud. VASLUI**

Container cu dimensiunile exterioare de: **5 m x 3 m x 2.86 m**

Structura sudata din profile zincate, de **2.5 mm**, si vopsite gri antracit RAL 7016
Pereti din panouri sandwich PUR cu grosimea de **40 mm**, culoare **alb RAL 9002**

Structura acoperis: de la exterior la interior:

- tabla zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- traverse din lemn si metal;
- folie anticondens;
- **panou sandwich 40 mm**;

Structura podea - de la exterior la interior:

- tabla cutata zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- **traverse din metal**;
- placa TEGO 18 mm;
- covor linoleum de trafic intens;

Instalatie electrica: panou electric cu sigurante automate de 6A si 16A, 5 buc. corp iluminat interior, intrerupatoare, priza exterioara de 16A.

TAMPLARIE: ALB (rama 40 mm)

- ★ Usa de intrare PMR din tamplarie PVC, 1200 x 2175 mm, integral panel deschidere dreapta, exterior;
- ★ Usa PMR din tamplarie PVC, 1200 x 2050 mm, integral panel deschidere dreapta, exterior;
- ★ Usa din tamplarie PVC, 700 x 2050 mm, integral panel, deschidere stanga interior;
- ★★ Fereastra din tamplarie PVC cu geam termopan, 500 x 600 mm, sistem de rabatare, plasa anti-insecte, deschidere dreapta.

Containerul include:

- 2 buc. wc;
- 1 buc. cadru PMR;
- 1 buc. bara de sprijin PMR;
- 2 buc. lavoar;
- 2 buc. oglinda;
- 2 buc. etajera;
- 3 buc. corp iluminat cu LED;
- 2 buc. convector 1000 W;
- 1 buc. rampa metalica acces persoane cu dizabilitati;
- 1 buc. boiler 20 litri.

Daca la locul descarcarii camionul cu macara nu poate intra sau nu poate descarca in locul indicat, eventuale costuri cu alte utilaje vor fi suportate de catre client.

Termen de executie: **12.08.2025**

BENEFICIAR
COMUNA BOGDANESTI

Secretar: **Stanga Gheorghita Laurentiu**


Contabil: **Blanaru Gabriel**



3000

2250

5000

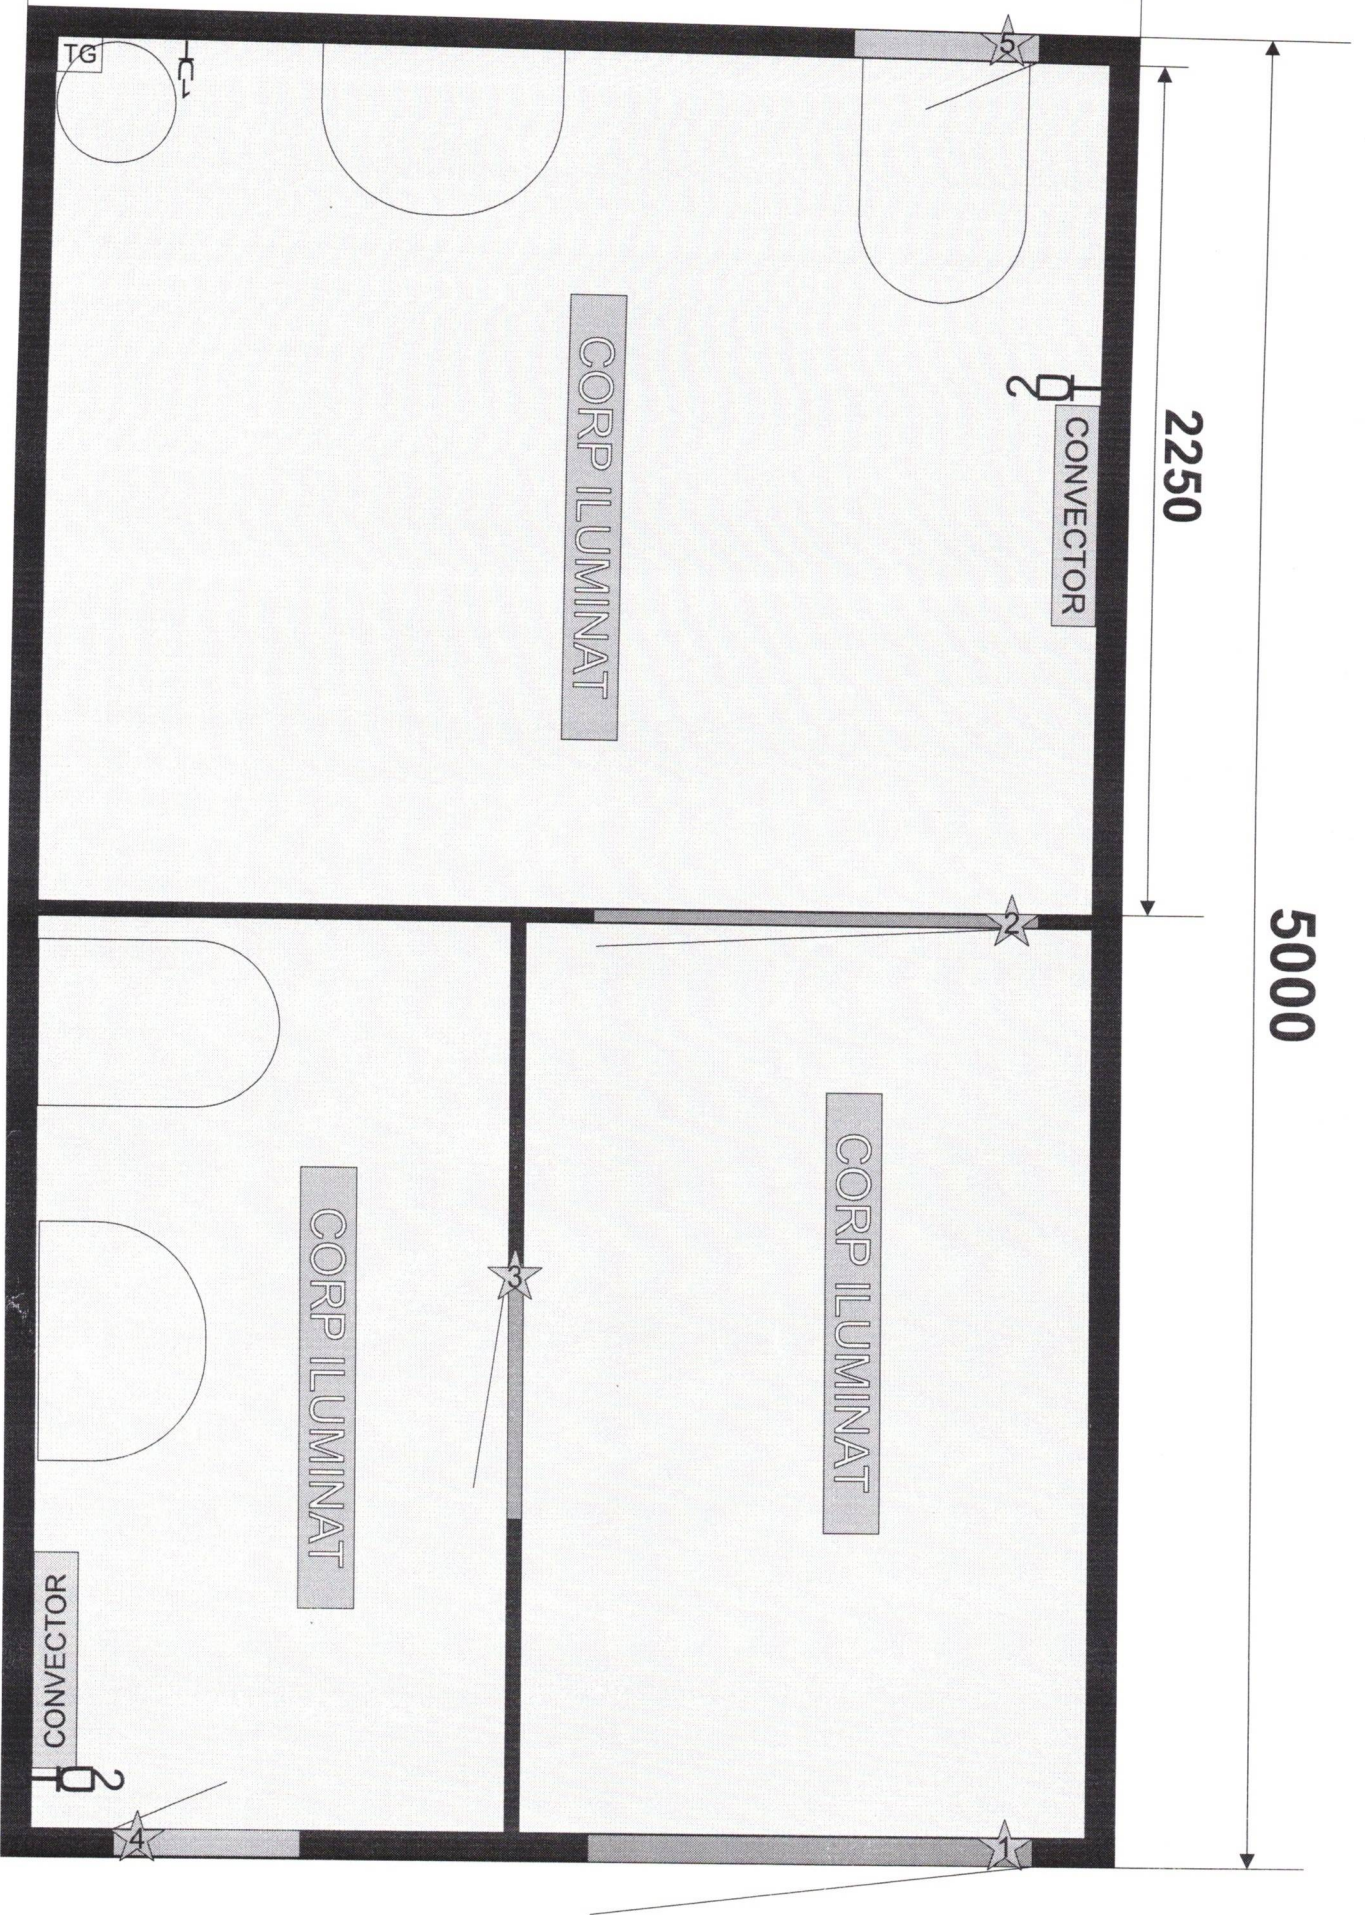

Client: **COMUNA BOGDANESTI**

Tel: **0726 529 120**

e-Mail: **vasluianuedina@yahoo.com**

Adresa descarcare: **Loc. BOGDANESTI, Jud. VASLUI**

Container cu dimensiunile exterioare de: **8 m x 3 m x 2.86 m**

Structura sudata din profile zincate, de **2.5 mm**, si vopsite gri antracit RAL 7016
Pereti din panouri sandwich PUR cu grosimea de **40 mm**, culoare **alb RAL 9002**

Structura acoperis: de la exterior la interior:

- tabla zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- traverse din lemn si metal;
- folie anticondens;
- **panou sandwich 40 mm;**

Structura podea - de la exterior la interior:

- tabla cutata zincata;
- vata minerala de 100 mm;
- **traverse din metal;**
- placa TEGO 18 mm;
- covor linoleum de trafic intens;

Instalatie electrica: panou electric cu sigurante automate de 6A si 16A, 5 buc. corp iluminat interior, intrupatoare, priza exterioara de 16A.

TAMPLARIE: ALB (rama 40 mm)

★ Usa de intrare din tamplarie PVC, 800 x 2175 mm, integral panel deschidere dreapta, exterior;

★★★★★ Usa din tamplarie PVC, 700 x 2050 mm, integral panel, deschidere dreapta interior;

★ Fereastra din tamplarie PVC cu geam termopan, 500 x 600 mm, sistem de rabatare, plasa anti-insecte, deschidere dreapta.

Containerul include:

- 8 buc. wc;
- 3 buc. lavoar;
- 3 buc. oglinda;
- 3 buc. etajera;
- 11 buc. corp iluminat cu LED;
- 1 buc. convector 1000 W.

Daca la locul descarcarii camionul cu macara nu poate intra sau nu poate descarca in locul indicat, eventuale costuri cu alte utilaje vor fi suportate de catre client.

Termen de executie: **12.08.2025**

BENEFICIAR
COMUNA BOGDANESTI

Secretar: **Stanga Gheorghita Laurentiu**

Contabil: **Blanaru Gabriel**



3000

16

TG

2

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

CORP ILUMINAT

8000

C

6
